



WBS	Task	Start	Finish	Days	%
1.3	INSTRUMENTAÇÃO	2026-07-31	2026-08-16	16	93
1.3.1	1ª ETAPA (até o tapume)	2026-07-31	2026-08-09	9	100
1.3.1.1	Isolamento	2026-07-31	2026-08-01	1	100
1.3.1.2	Remoção dos blocos	2026-08-03	2026-08-03	0	100
1.3.1.3	Escavação (80cmX1m)	2026-08-04	2026-08-04	0	100
1.3.1.4	Infraestrutura	2026-08-04	2026-08-05	1	100
1.3.1.5	Reaterro	2026-08-05	2026-08-06	1	100
1.3.1.6	Recompisoção dos blocos	2026-08-06	2026-08-08	2	100
1.3.1.7	Liberação	2026-08-08	2026-08-09	1	100
1.3.2	2ª ETAPA (até a caixa de passagem)	2026-08-10	2026-08-16	6	85
1.3.2.1	Isolamento	2026-08-10	2026-08-11	1	100
1.3.2.2	Remoção dos blocos	2026-08-11	2026-08-11	0	100
1.3.2.3	Escavação	2026-08-12	2026-08-12	0	100
1.3.2.4	Infraestrutura	2026-08-12	2026-08-13	1	100
1.3.2.5	Reaterro	2026-08-13	2026-08-14	1	100
1.3.2.6	Recompisoção dos blocos	2026-08-14	2026-08-15	1	95
1.3.2.7	Liberação	2026-08-15	2026-08-16	1	0
1.4	INCÊNDIO	2026-08-14	2026-08-24	10	0
1.4.1	Isolamento / locação	2026-08-14	2026-08-15	1	0
1.4.2	Infraestrutura	2026-08-17	2026-08-18	1	0
1.4.3	Montagem da tubulação	2026-08-18	2026-08-19	1	0
1.4.4	Hidrante	2026-08-20	2026-08-20	0	0
1.4.5	Acabamentos (pintura/selagem/sinalizaç..	2026-08-20	2026-08-22	2	0
1.4.6	Teste Hidrostático	2026-08-22	2026-08-23	1	0
1.4.7	Vistoria / limpeza fina	2026-08-23	2026-08-24	1	0

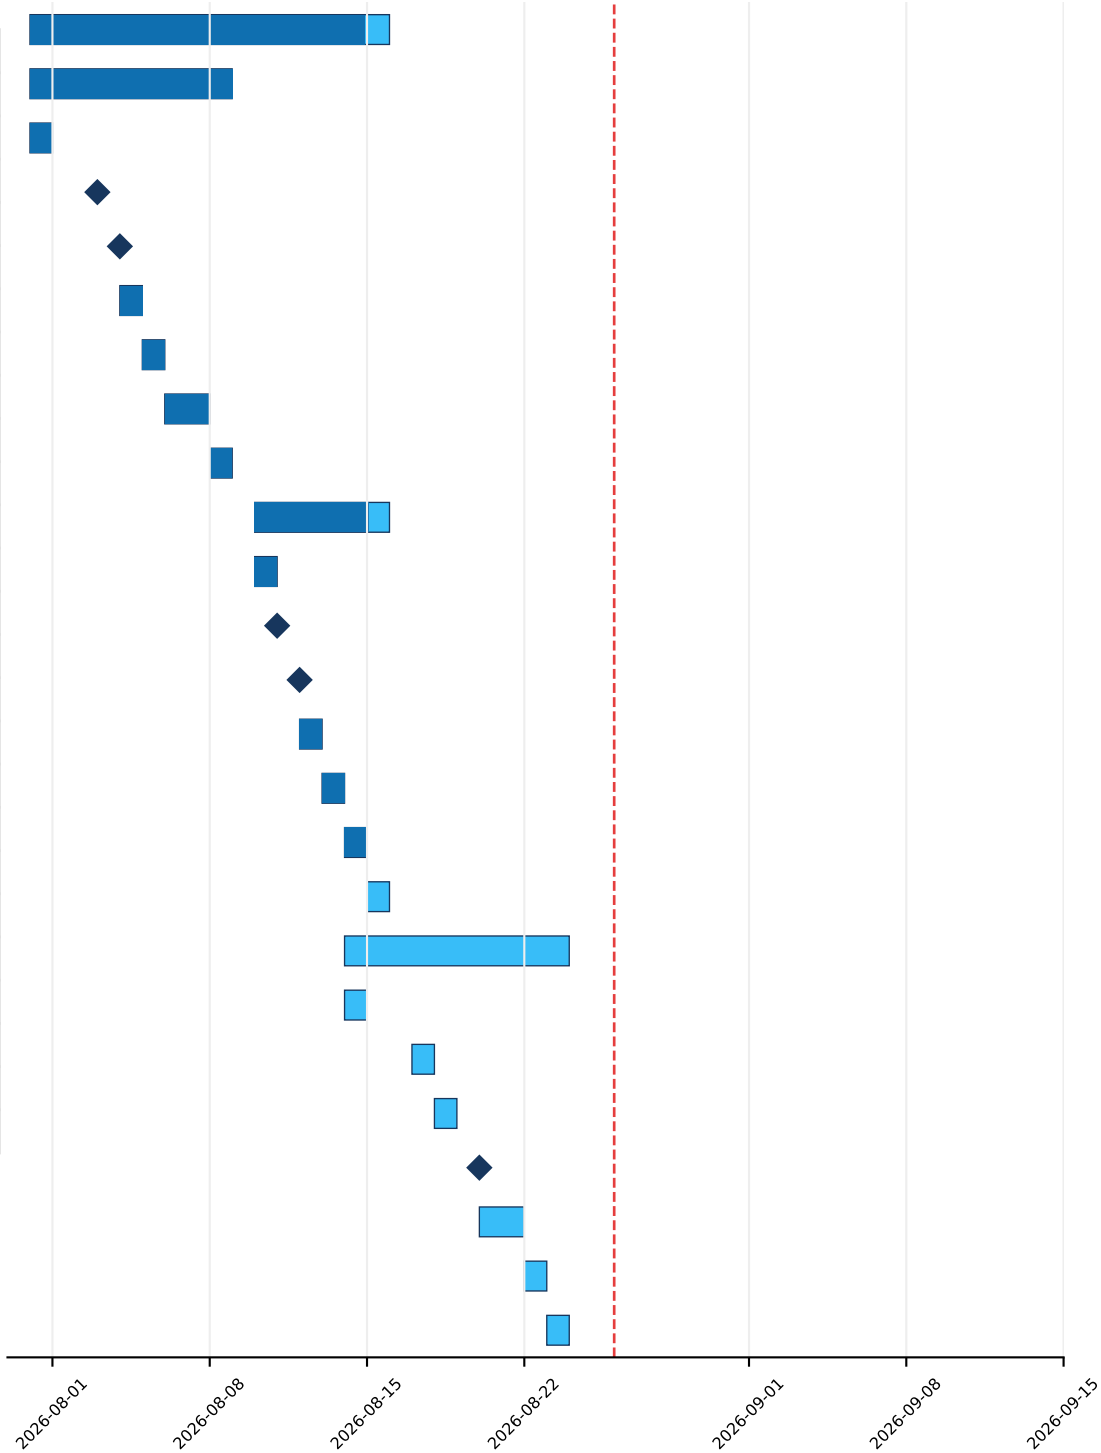

WBS	Task	Start	Finish	Days	%
1.5	SERVIÇOS FINAIS	2026-09-09	2026-09-14	5	0
1.5.1	Desmobilização e Limpeza Final	2026-09-09	2026-09-14	5	0
1.5.2	Vistoria e Entrega	2026-09-09	2026-09-14	5	0
1.6	Finalização	2026-09-14	2026-09-14	0	0
	Caixa BEP/aterramento (executar suport..	2026-08-21	2026-08-21	0	-
	Start-up nobreak	2026-08-06	2026-08-06	0	-
	Montagem do Rack	2026-08-06	2026-08-06	0	-
	Certificação do Rack (equipe Technip)	-	-	-	-
	Laudo de aterramento	2026-08-21	2026-08-21	0	-
	Mudar a infra do braço da talha	2026-08-21	2026-08-21	0	-
	Infra das travas da porta	2026-08-21	2026-08-21	0	-
	Eletrocalha na entrada do Rack de came..	2026-08-21	2026-08-21	0	-
	Instalação de fotocélula nos refletore...	2026-08-10	2026-08-10	0	-
	Boia eletrônica (chegada de material)	2026-08-07	2026-08-07	0	-
	Elaboração de diagramas e limpeza técn..	2026-08-19	2026-08-19	0	-
	Certificado dos cabos	-	-	-	-
	Revestimento casa de máquinas (lã de r...	2026-08-18	2026-08-18	0	-
	Pintura no pé do pilar interno (casa m...	2026-08-18	2026-08-18	0	-
	Instalação da torneira da casa de máqu...	2026-08-21	2026-08-21	0	-
	Cantoneira de acabamento	2026-08-19	2026-08-19	0	-
	Pintura geral final do prédio Parte ci...	2026-08-21	2026-08-21	0	-
	Pintura Zebrada Caixa separadora agua ..	2026-08-25	2026-08-25	0	-
	Instalação da veneziana do portão prin...	2026-08-23	2026-08-23	0	-
	Plantio de grama	2026-08-20	2026-08-20	0	-
	Instalação de castelo na esquadria	2026-08-19	2026-08-19	0	-

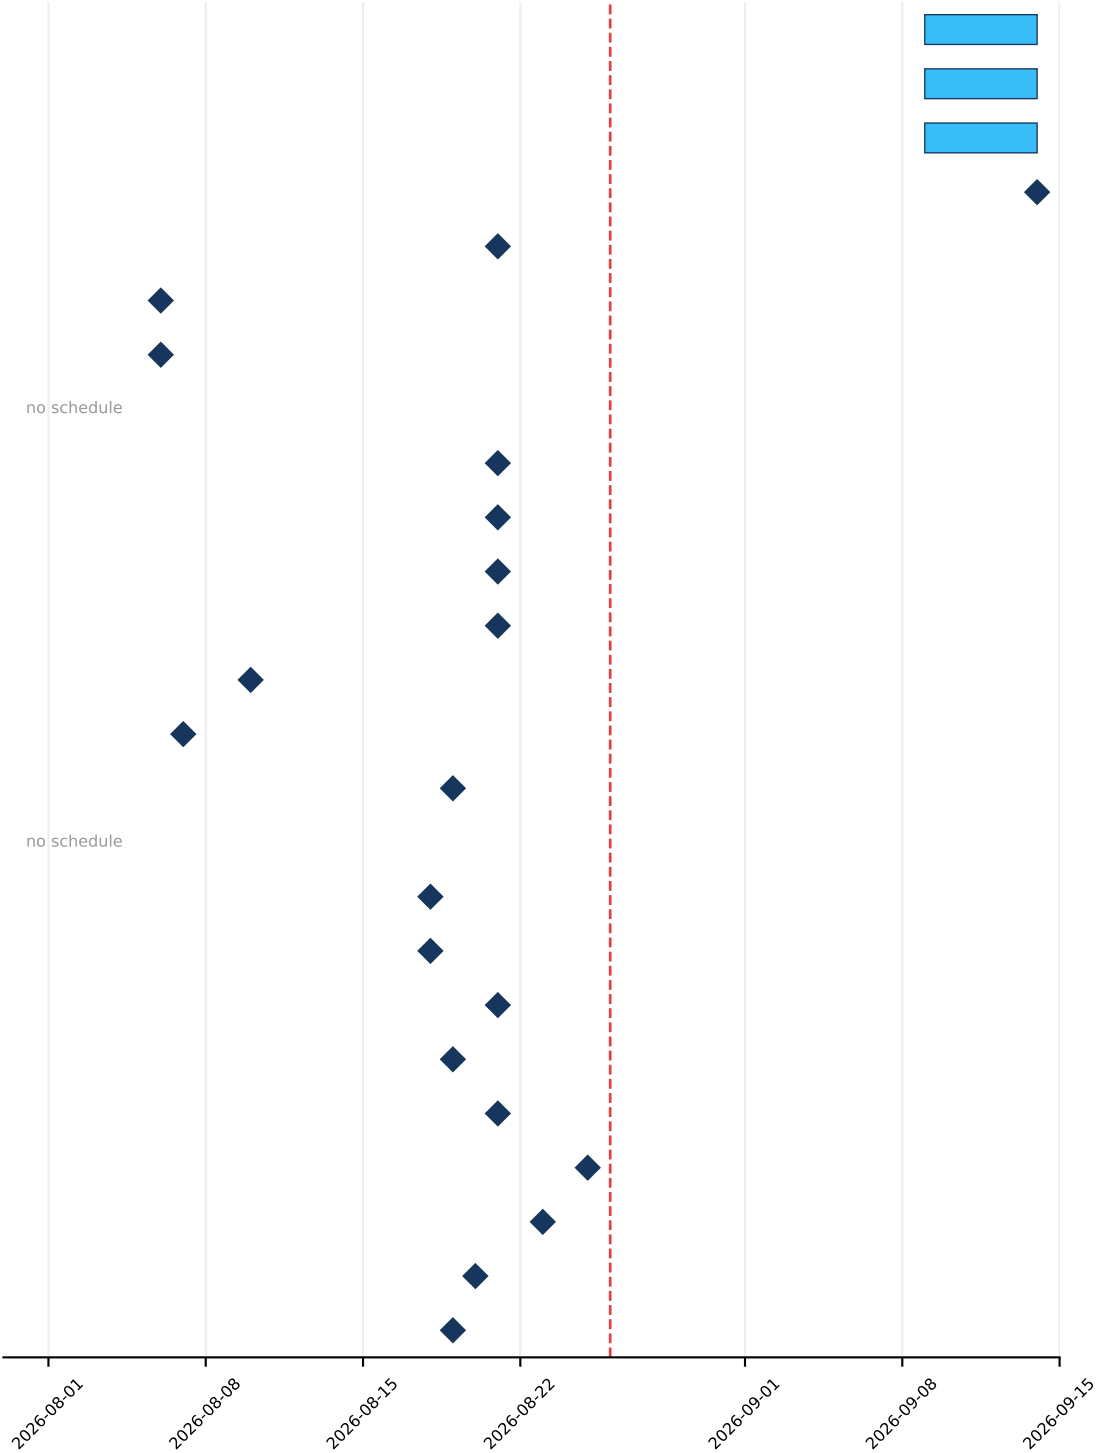

WBS	Task	Start	Finish	Days	%
	Readequação da Monocapa	2026-08-23	2026-08-23	0	-
	Pintura das guias	2026-08-25	2026-08-25	0	-
	Pintura do caminho seguro	2026-08-25	2026-08-25	0	-
	Readequação do piso intertravado	2026-08-20	2026-08-25	5	-
	Maria, Maria	2026-08-23	2026-08-28	5	-
	Maria, Maria	2026-08-23	2026-08-28	5	-

